



BMB609 – Proje Yönetimi  
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Miraç ELİGÜZEL

UniSphere

Mehmet Efe KUTLU  
Memik Yusuf DİKİCİ  
Efe ÖFKELİ  
Cuma Ertuğrul BULUT  
Ali Arda BÜYÜKTÜRK

# UniSphere: Üniversiteye Özel Sosyal Medya Platformu Proje Raporu

## 1. Proje Özeti

**UniSphere**, üniversite öğrencileri, akademisyenler ve idari personel için tasarlanmış, üniversite yaşamını kolaylaştıran ve zenginleştiren, güvenli ve etkileşimli bir sosyal medya platformudur. Mevcut genel sosyal medya platformlarının üniversite özelindeki eksikliklerini gidermeyi ve kampüs içi iletişimi, akademik işbirliğini ve sosyal etkileşimi optimize etmeyi hedefler. Bu proje, **emsalsiz (özgün)** bir ürün ortaya koymayı, **tekrarlanmayan** bir süreç izlemeyi ve belirli **kısıtlar (zaman, bütçe, işgücü)** dahilinde **planlama, yönetim ve kontrol** faaliyetlerini gerektiren bir yapıya sahiptir.

## 2. Vizyon ve Misyon

- Vizyon:** Her üniversite öğrencisinin, akademisyeninin ve idari personelinin dijital kampüs deneyimini birleştiren, verimli ve kapsayıcı bir ekosistem yaratmak.
- Misyon:** Üniversite topluluğunun akademik, sosyal ve kişisel gelişim ihtiyaçlarını karşılayan, güvenli, kullanıcı dostu ve yenilikçi bir platform sunarak kampüs yaşamını daha kolay, daha bağlantılı ve daha anlamlı hale getirmek.

## 3. Hedef Kitle

- Üniversite Öğrencileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
- Akademisyenler (Öğretim Üyeleri, Araştırma Görevlileri)
- İdari Personel (Fakülte Sekreterlikleri, Öğrenci İşleri, Kütüphane vb.)

## 4. SWOT Analizi

UniSphere projesinin stratejik konumlandırması için yapılan SWOT analizi sonuçları aşağıdadır:

| Güçlü Yönler (Strengths)       | Zayıf Yönler (Weaknesses)    |
|--------------------------------|------------------------------|
| Üniversite odaklı niş yaklaşım | Yüksek başlangıç maliyetleri |

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Doğrulanmış kullanıcı tabanı (.edu.tr)  | Mevcut platformlardan kullanıcı çekme zorluğu |
| Akademik ve sosyal entegrasyon          | Sürekli moderasyon ihtiyacı                   |
| <b>Fırsatlar (Opportunities)</b>        | <b>Tehditler (Threats)</b>                    |
| Üniversitelerle resmi ortaklıklar       | Büyük sosyal medya devlerinin rekabeti        |
| Eğitim teknolojileri (LMS) entegrasyonu | Veri gizliliği ve yasal düzenlemeler (KVKK)   |
| Mezun ağının dahil edilmesi             | Teknolojik trendlerin hızla değişmesi         |

## 5. Proje Yönetimi Bilgi Alanları ve UniSphere

UniSphere projesinin başarılı bir şekilde tamamlanması için Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) tarafından tanımlanan bilgi alanları temel alınacaktır:

### 5.1. Temel Bilgi Alanları

- Proje Entegrasyon Yönetimi:** Projenin farklı bileşenlerinin birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlamak.
- Proje Kapsam Yönetimi:** Projenin neleri içerip neleri içermediğini tanımlamak ve kontrol etmek.
- Proje Zaman Yönetimi:** Proje faaliyetlerinin zamanında tamamlanmasını sağlamak.
- Proje Maliyet Yönetimi:** Projenin onaylanmış bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlamak.
- Proje Kalite Yönetimi:** Belirlenen kalite standartlarını (güvenlik, performans, kullanılabilirlik) karşılamak.

### 6.1. Proje Kapsam Yönetimi Detayları

UniSphere projesinin kapsam yönetimi, ürün ve proje kapsamı ayrımı yapılarak titizlikle yürütülecektir.

- Sistem mimarisinin tasarımı ve veritabanı kurulumu.
- UI/UX prototiplerinin oluşturulması.
- Mobil (iOS/Android) ve Web arayüz kodlaması.
- Beta test süreci ve üniversite entegrasyonları.

## 6.2. Ürün Kapsamı

UniSphere'in sahip olması gereken özellikler ve işlevlerdir:

- Kullanıcı Yönetimi ve Güvenlik (E-posta doğrulaması, rol tabanlı erişim)
- Akademik Destek Modülü (Ders odaları, not paylaşımı, Soru-Cevap forumu)
- Sosyal Etkileşim Modülü (Etkinlik takvimi, kulüp sayfaları, kampüs haritası)
- Kariyer Modülü (Kariyer merkezi entegrasyonu, mentorluk programları)
- KVKK uyumlu güvenli veri altyapısı.

## 6.3. İş Kırılım Yapısı (WBS)

Proje, yönetilebilir parçalara (iş paketleri) ayrılarak karmaşıklık azaltılmıştır. Aşağıdaki diyagram UniSphere projesinin hiyerarşik görev dağılımını göstermektedir:

### 1.1 Kullanıcı Yönetimi

- 1.1.1 E-posta Doğrulama
- 1.1.2 Rol Yönetimi
- 1.1.3 Profil Yönetimi

### 1.2 Akademik Modül

- 1.2.1 Ders Odaları
- 1.2.2 Not Paylaşımı
- 1.2.3 Soru-Cevap

### 1.3 Sosyal Modül

- 1.3.1 Etkinlik Takvimi
- 1.3.2 Kulüp Sayfaları
- 1.3.3 Kampüs Haritası


### 1.4 Kariyer Modülü

- 1.4.1 Kariyer Merkezi
- 1.4.2 Mentorluk

### 1.5 Teknik Altyapı

- 1.5.1 Front-end

- 1.5.2 Back-end
- 1.5.3 Veritabanı



## 7. LRC (Lineer Sorumluluk Çizelgesi) / RACI Matrisi

Görev ve sorumlulukların paydaşlara dağılımı aşağıdaki tabloda tanımlanmıştır:

| Görev / Paydaş     | Proje Yöneticisi | Yazılım Ekibi | Tasarım Ekibi | Üniversite Yön. |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Proje Planlama     | A                | R             | C             | I               |
| Kapsam Tanımı      | A                | C             | C             | C               |
| UI/UX Tasarım      | A                | C             | R             | I               |
| Yazılım Geliştirme | A                | R             | C             | I               |
| Test & QA          | A                | R             | C             | I               |

(Kısaltmalar: A: Hesap Veren, R: Sorumlu, C: Danışılan, I: Bilgilendirilen)

## 8. Proje Zaman Planlaması ve Ağ Diyagramı

Projenin kritik yolunun (Critical Path) belirlenmesi için **İleri Geçiş (Forward Pass)** ve **Geri Geçiş (Backward Pass)** hesaplamaları yapılmıştır.

### 8.1. Faaliyet Listesi ve Süreler

- **A:** Gereksinim Analizi (5 gün)
- **B:** Sistem Tasarımı (10 gün) - *Öncül: A*
- **C:** Kodlama (20 gün) - *Öncül: B*
- **D:** Test Süreci (7 gün) - *Öncül: C*


### 8.2. Kritik Yol Analizi (CPM)

Projenin en erken tamamlanma süresi faaliyetlerin en uzun yoluna bağlıdır.

- **Kritik Yol:** A -> B -> C -> D
- **Toplam Süre:** 42 İş Günü
- **Erken Başlangıç (ES) ve Erken Bitiş (EF):** Proje 0. günde başlar; A faaliyeti 5. günde biter ( $t_1=0$ ,  $t_2=5$ ).


## 9. Ağ Diyagramı (Network Diagram)

Proje faaliyetlerinin birbirine bağlılığı ve iş akışı aşağıda görselleştirilmiştir:

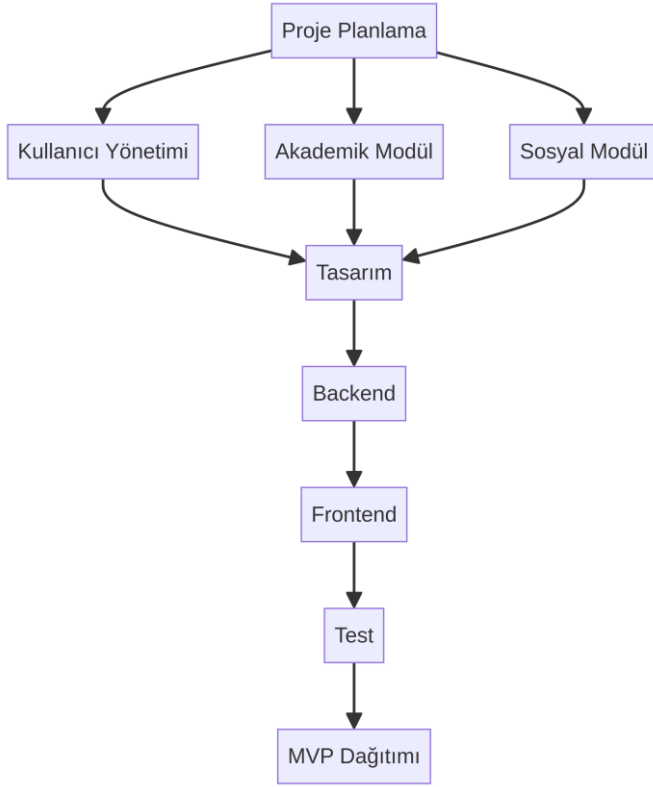

## 10. Balık Kılçığı (Ishikawa) Diyagramı

Platformun başarısı için kritik bir risk olan "Düşük Kullanıcı Etkileşimi" sorununun kök neden analizi yapılmıştır:

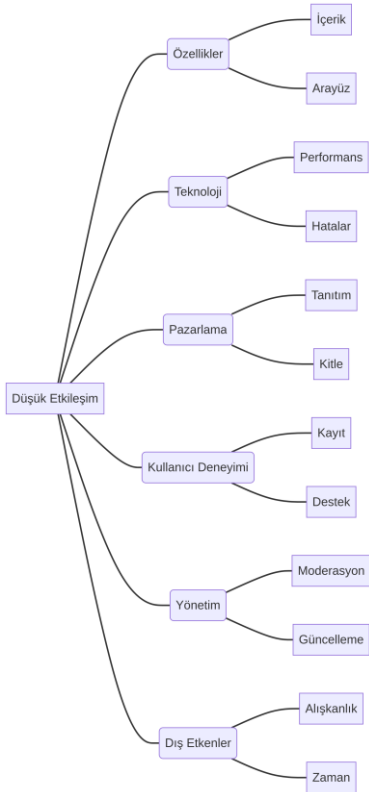

## 11. BÜTÜNLEŞİK DEĞİŞİKLİK KONTROLÜ VE KAPANIŞ

Projeler nadiren orijinal planlara sadık kalır. UniSphere'de değişim şu süreçle yönetilir:

1. **Değişiklik Talebi:** Herhangi bir kapsam değişikliği (örn: yeni bir modül eklenmesi) resmi olarak talep edilir.
2. **Analiz:** Değişikliğin bütçe ve takvim üzerindeki etkisi değerlendirilir.
3. **Onay/Red:** Değişiklik Kontrol Kurulu onayı sonrası ana plan güncellenir.

### 11.1. Projenin Kapatılması

Proje bittiğinde iki temel prosedür uygulanır:

- **İdari Kapanış:** Proje belgelerinin arşivlenmesi ve "Kazanılan Dersler" raporunun yazılması.
- **Sözleşme Kapanışı:** Teslimat kalemlerinin (platformun) üniversite yönetimine resmi devri ve onayların alınması.
