



GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

PROJE ANALİZ VE PLANLAMA RAPORU

Ders Adı ve Kodu: Proje Yönetimi - BMB609

Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Miraç ELİGÜZEL

Grup Üyeleri

1. Melisa ALKAN 230007011
2. Sümeyye Azra CEBE 230007025
3. Çiğdem DİLEKÇİ 230007037
4. Dilara BİRCAN 230007018
5. Ahmet Çağlar ARSLANTAŞ 230007012

Teslim Tarihi: 27.03.2026

PROJE ANALİZ VE PLANLAMA RAPORU

Market Satış ve Kasa Yönetim Sistemi (POS)

Proje Adı	Market Satış ve Kasa Yönetim Sistemi (POS)
Proje Türü	Yazılım Geliştirme – C Türü Proje (Orta Karmaşıklık)
Ekip Büyüklüğü	5 Kişi
Tahmini Süre	9 – 10 Ay
Hazırlanma Tarihi	Mart 2026

1. Projenin Tanımı

PMI'ye göre proje; benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonucun üretildiği, tekrarlı olmayan bir çalışmadır. Juran projeyi "çözüm için çizelgelenmiş bir problem" olarak tanımlarken; Prof. Dr. Barutçugil ise "belirli kaynaklarla belirli bir zaman içerisinde tamamlanması gereken ve tekrarlanmayan özel faaliyetler topluluğu" olarak ifade etmektedir.

Proje Özeti

Bu proje; market işletmelerindeki perakende satış operasyonlarını dijitalleştirmek, hızlandırmak ve veri bütünlüğünü sağlamak amacıyla tasarlanmış entegre bir elektronik Satış Noktası (POS) sistemidir. 5 kişilik bir ekip tarafından yaklaşık 9-10 ay sürede tamamlanması planlanmaktadır.

Temel Özellikler


- Emsalsiz ve özgün bir yazılım ürünü – piyasadaki hazır çözümlerden farklılaşan özel bir sistem
- Tekrarlanmayan bir süreç – her müşteriye özel konfigürasyon ve kurulum gerektirmektedir
- Kısıtlı: Belirli bütçe, zaman (9-10 ay) ve 5 kişilik insan kaynağı ile sınırlandırılmıştır
- Planlama, yönetim ve kontrol gerektiren çok bileşenli bir süreçtir

Proje Kapsamı

- Kimlik doğrulama ve kasiyer oturum yönetimi modülü
- Kategorik ürün navigasyonu (Meyve, Sebze, Baklagil, Atıştırmalık, Kuruyemiş)
- Dinamik sepet yönetimi – ürün adı, miktar/ağırlık, kalem tutarı gösterimi
- Ödeme işlemi tamamlama ve fatura oluşturma
- Veritabanı log kaydı ve geriye dönük denetim altyapısı

2. Proje Üçgeni (Kapsam – Zaman – Maliyet)

Proje yönetiminde "Demir Üçgen" ya da "Proje Üçgeni" olarak bilinen bu model; Kapsam, Zaman ve Maliyet olmak üzere üç temel kısıtı bir arada ele alır. Bu üç boyuttan herhangi birinde yapılacak değişiklik, diğerlerini doğrudan etkiler.

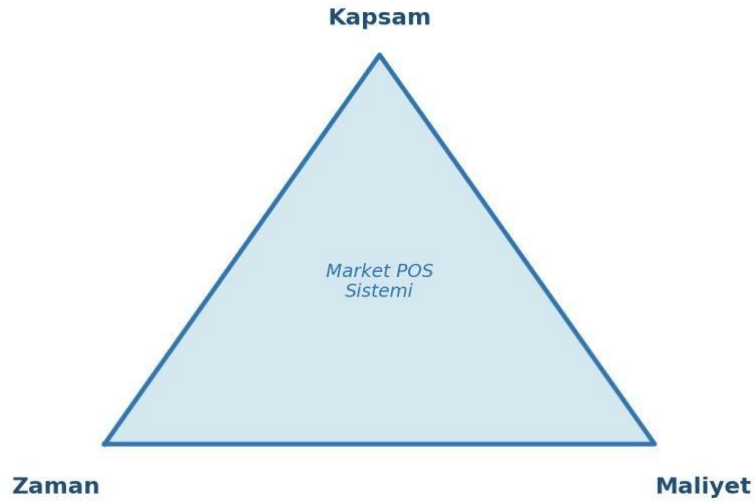

Şekil 1 – Proje Üçgeni: Market POS Sistemi

Market POS Sistemi İçin Üçgen Analizi

Boyut	Hedef	Risk
Kapsam	5 modül: Auth, UI, Sepet, Ödeme, DB Log	Kapsam kayması – yeni modül talepleri
Zaman	9-10 ay (Eylül 2026 hedef)	Geliştirme gecikmeleri, entegrasyon sorunları
Maliyet	5 kişi × 10 ay emek + donanım	Bütçe aşımı, ek lisans ücretleri

3. Proje Türü ve Sınıflandırması

Projeler; karmaşıklık derecesi, teknoloji seviyesi, risk seviyesi ve proje süresine göre A, B, C ve D türlerine ayrılmaktadır. Market POS projemiz, bu tablo çerçevesinde değerlendirildiğinde C Türü Proje kapsamında yer almaktadır.

Projenin Özellikleri	A Türü	B Türü	C Türü ✓	D Türü
Karmaşıklık	Çok Düşük	Düşük	Orta	Yüksek
Teknoloji	Teorik	Mevcut	Yüksek	Yeni/Buluş
Risk	Çok Düşük	Düşük	Orta	Yüksek
Süre	< 3 ay	3–9 ay	9–18 ay	> 18 ay

Tablo 1 – Proje Türleri Karşılaştırma Tablosu (Market POS = C Türü)

C Türü Proje Neden?


- Orta karmaşıklık: 5 farklı modül; birbirine bağımlı bileşenler ve entegrasyon gereklilikleri mevcuttur
- Yüksek teknoloji: Gerçek zamanlı veritabanı işlemleri, authentication sistemi ve dinamik UI geliştirme
- Orta risk: Donanım uyumluluk, veri güvenliği ve kullanıcı adaptasyonu riskleri bulunmaktadır
- Orta-Uzun süre: 9-10 aylık tahmini geliştirme süresi C türü projelerin 9-18 ay bandına girmektedir

Büyükölük ve Sektör Sınıflandırması

- Büyükölük: Orta ölçekli yazılım projesi (5 kişilik ekip)
- Yürütücü kuruluş: Özel girişim / startup geliştirme ekibi
- Amaç: Süreç iyileştirme ve dijital dönüşüm
- Katkı: Üretkenlik artışı, hata azaltma, veri izlenebilirliği
- Sektör: Perakende / bilgi teknolojileri

4. SWOT Analizi

SWOT analizi, projenin stratejik değerlendirmesinde kullanılan en temel araçlardan biridir. İç faktörler olan Güçlü (Strengths) ve Zayıf (Weaknesses) yönlerin yanı sıra, dış faktörler olan Fırsatlar (Opportunities) ve Tehditler (Threats) bir arada değerlendirilerek projenin başarı potansiyeli ortaya konur.

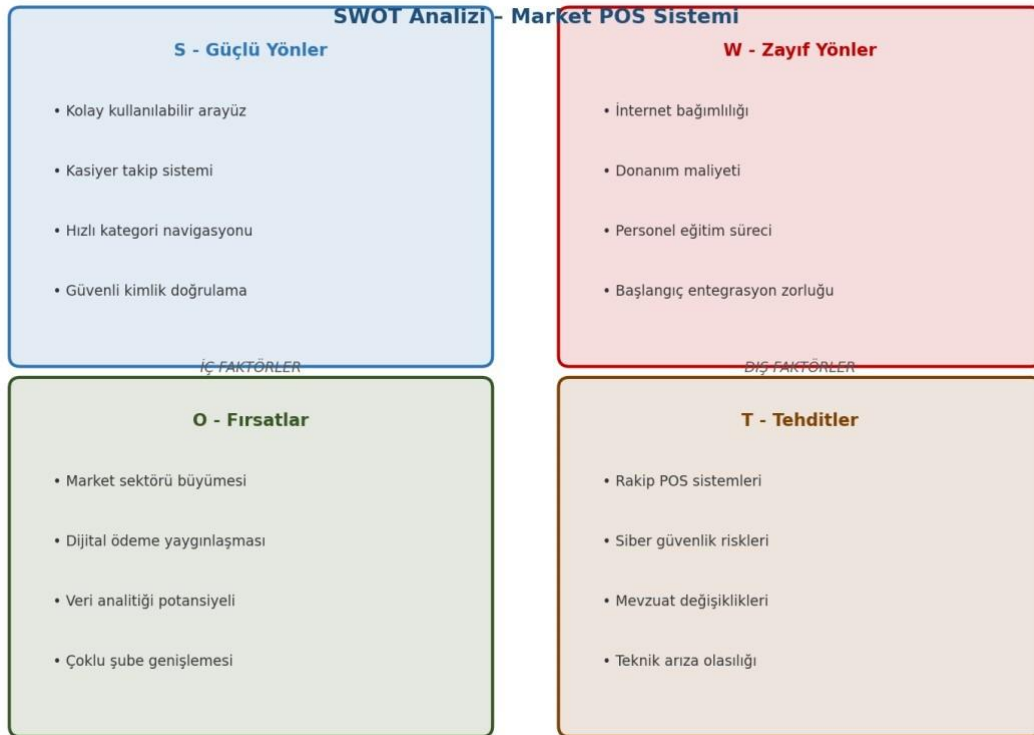

SWOT Bulgularının Yorumu

Güçlü Yönler: Sistemin ergonomik kasiyer arayüzü, kimlik doğrulama altyapısı ve log kaydı mekanizması; hem kullanıcı memnuniyetini hem de yönetilebilirliği artıracaktır. Hiyerarşik kategori yapısı, çok sayıda ürünle çalışan kasiyerlerin iş hızını önemli ölçüde yükseltecektir.

Zayıf Yönler: Başlangıç donanım maliyeti ve personel eğitim süreci kısa vadede bütçe üzerinde baskı oluşturacaktır. İnternet bağımlılığı, bağlantı kesintilerinde sistem kullanımını sekteye uğratabilir.

Fırsatlar: Türkiye'de market sektörünün ve dijital ödemelerin hızlı büyümesi, sistemin benimsenmesini kolaylaştırmaktadır. Toplanan satış verilerinin analitik amaçlarla kullanılması rekabetçi bir avantaj yaratacaktır.

Tehditler: Mevcut rakip POS çözümleri (iyzico, PayTR vb.) ve olası siber saldırılar projenin risklerini oluşturmaktadır. Fiyatlandırma mevzuatındaki değişiklikler sistemin güncellenmesini zorunlu kılabilir.

5. Proje Yönetimi Araçları ve Teknikleri

Delphi Tekniği

Delphi tekniği, belirsizliğin hakim olduğu durumlarda uzman görüşlerini sistematik olarak toplayan ve uzlaşmaya ulaşmayı hedefleyen bir tahmin yöntemidir. Market POS projesinde bu teknik; sistem gereksinimlerinin önceliklendirilmesinde ve teknik risk tahminlerinde uygulanacaktır.

Adım	Aşama	Market POS İçeriği
1	Problem Tanımlama	Yazılım geliştirme sürecindeki kritik riskler belirlenir.
2	Uzman Anketi	Yazılım mühendisleri, güvenlik uzmanları ve UX tasarımcılarına anket gönderilir.
3	Yanıtların Derlenmesi	Gelen öneriler sınıflandırılır; kimlik doğrulama riskleri, sepet mantığı hataları, veri güvenliği sorunları öne çıkar.
4	Geri Bildirim	Uzmanlar diğer görüşleri inceleyerek değerlendirmelerini günceller.
5	Uzlaşma	Birden fazla turda tekrarlanan döngü sonucunda uzlaşma sağlanır.

Tablo 2 – Delphi Tekniği Uygulama Adımları: Market POS

Nominal Grup Tekniği

Nominal Grup tekniğinde, tıpkı Delphi tekniğinde olduğu gibi konu uzmanlarından yazılı görüşler alınır. Ancak Delphi'den farklı olarak uzmanlar bir araya gelir ve tartışmak yerine

fikirleri oylar. Market POS projesinde bu teknik, özellikle arayüz tasarım kararları için kullanılacaktır.

Uygulama Adımları:

1. Ekip üyeleri birbirinden bağımsız olarak POS sisteminin en kritik özelliklerini listeler
2. Herkes listesini sunar, tartışma yapılmaz
3. Oy verme turunda her üye önem sırasına göre maddeleri puanlar
4. En yüksek puanı alan özellikler (kimlik doğrulama, hızlı kategori navigasyonu, güvenli log) öncelikli geliştirme kapsamına alınır

Beyin Fırtınası

Beyin fırtınası; ekip üyelerine eleştirilme kaygısı taşımadan özgürce fikir üretme fırsatı tanıyan, yaratıcı çözüm arayışı odaklı bir tekniktir. Market POS projesinde bu teknik, kullanıcı deneyimi (UX) geliştirme sürecinde uygulanmıştır.

Market POS için Öne Çıkan Beyin Fırtınası Fikirleri:

- Barkod okuyucu entegrasyonu ile ürün ağırlık/fiyat otomatik hesaplama
- Sesli uyarı sistemi – yanlış barkod veya eksik stok durumunda kasiyer bilgilendirme
- Günlük satış özeti ekranı – kasa kapanışında otomatik rapor
- Sadakat kartı / indirim kuponu modülü
- Dokunmatik ekran optimizasyonu – hızlı ürün seçimi için büyük buton tasarımı
- Çevrimdışı mod – internet kesilmesi durumunda yerel veri depolama

6. Balık Kılçığı (Neden-Sonuç) Diyagramı


Balık Kılçığı Diyagramı (Ishikawa Diyagramı), 1943 yılında Kaoru Ishikawa tarafından geliştirilmiştir. Bir problemin ortaya çıkmasında etkili olan nedenleri sistematik biçimde görselleştiren bu araç, Market POS sisteminin olası satış hatalarının kök nedenlerini analiz etmek için kullanılmıştır.

Balık kılçığı diyagramının oluşturulma adımları şu şekildedir:

5. Problemi belirle: "Satış İşlemi Hataları" – yanlış ürün, yanlış fiyat veya kayıp işlem

6. Problemin ana nedenlerini belirle: Personel Hatası, Sistem Hatası, Donanım Sorunu, Veri Hatası
7. Problemin olası alt nedenlerini belirle (her ana neden için 2-3 alt etken)
8. Alternatif çözüm yollarını düşün: eğitim, test süreci, yedek sistem
9. Bir alternatifi seç ve uygula: Kapsamlı entegrasyon testleri + personel eğitim programı

Balık Kılıçığı (Neden-Sonuç) Diyagramı - Market POS Sistemi

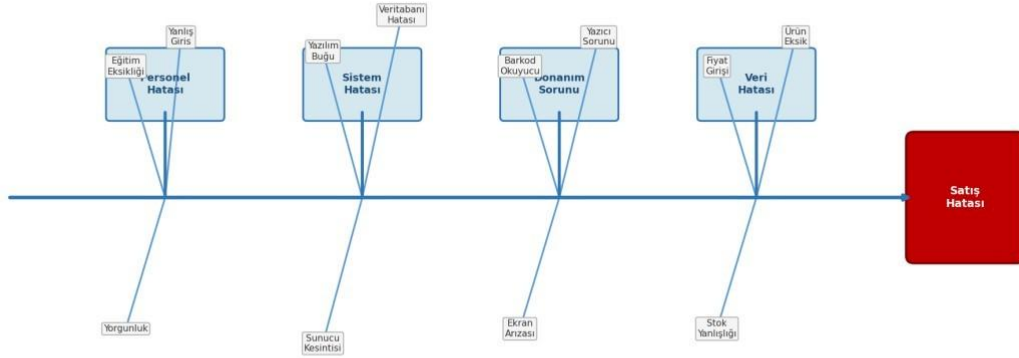

Şekil 3 – Balık Kılıçığı Diyagramı: Market POS Sistemi Satış Hatası Analizi

Diyagramdan elde edilen bulguya göre en kritik risk grubu "Personel Hatası" ve "Sistem Hatası" kategorileridir. Bu nedenle geliştirme sürecinde aşağıdaki önlemler alınacaktır:

- Kapsamlı birim ve entegrasyon testleri
- Canlıya alım öncesi 2 haftalık pilot kullanım
- Kasiyerler için etkileşimli kullanım kılavuzu
- Sistem hatalarını anlık bildiren hata loglama mekanizması

7. Proje Planlaması

Proje planı; bir projeyi başlatmak, uygulamak ve sonlandırmak için gerekli tüm unsurları içeren kapsamlı bir belgedir. Market POS projesi için hazırlanan bu ana plan; kaynak kullanımlarının izlenmesini, başarılabacak işlerin belirlenmesini, tüm tahminlerin yazılı hale getirilmesini ve kontrol noktalarının tanımlanmasını kapsamaktadır.

Proje Ana Planının Temel Unsurları

10. Genel Bakış – Projenin amacı, kapsamı ve paydaş özeti

11. Hedefler – İşlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimler
12. Genel Yaklaşım – Agile/Scrum metodolojisi, 2 haftalık sprint döngüleri
13. Sözleşmeler – Ekip içi sorumluluk dağılımı, teslim kriterleri
14. Zaman Çizelgeleri – Gantt şeması ve kritik yol analizi
15. Değerlendirme Yöntemleri – Sprint retrospektif toplantıları, KPI takibi
16. Olası Problemler – Risk kaydı ve azaltma stratejileri


Ekip Organizasyonu (5 Kişi)

#	Rol	Sorumluluk	Modül
1	Proje Yöneticisi	Planlama, takip, koordinasyon	Tüm modüller
2	Backend Geliştirici	Veritabanı, API, iş mantığı	DB Log, Auth, Ödeme
3	Frontend Geliştirici	UI tasarım ve geliştirme	Arayüz, Sepet Ekranı
4	Test Mühendisi	Test planı, hata raporlama	Tüm modüller
5	Sistem Analisti	Gereksinim analizi, dokümantasyon	Kapsam, WBS, Raporlar

Tablo 3 – Ekip Organizasyonu ve Sorumluluk Dağılımı

Gantt Şeması (Proje Takvimi)


Aşağıdaki Gantt şeması, projenin 10 aylık zaman çizelgesini ve her görevin başlangıç-bitiş tarihlerini göstermektedir. Kritik yol; Sistem Tasarımı → Backend Geliştirme → Entegrasyon Testleri aşamalarından oluşmaktadır.

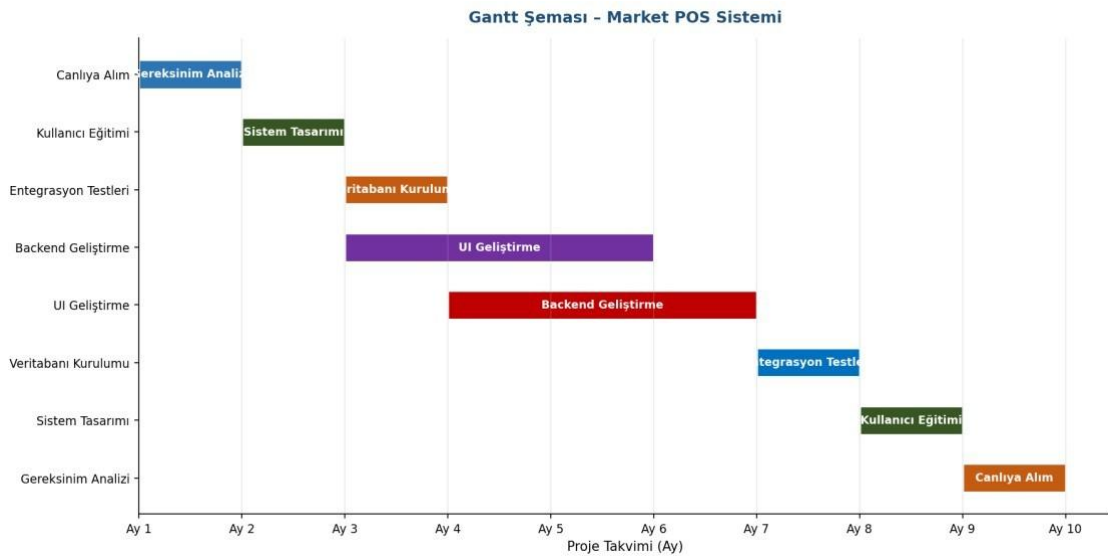

Şekil 4 – Gantt Şeması: Market POS Sistemi 10 Aylık Proje Takvimi

8. İş Kırılım Yapısı (WBS)

İş Kırılım Yapısı (Work Breakdown Structure – WBS), projenin tüm çalışma kapsamını hiyerarşik olarak alt bileşenlerine ayıran temel planlama aracıdır. Her iş paketi; sorumlu kişi, başlangıç-bitiş tarihi ve maliyet tahmini ile ilişkilendirilir.

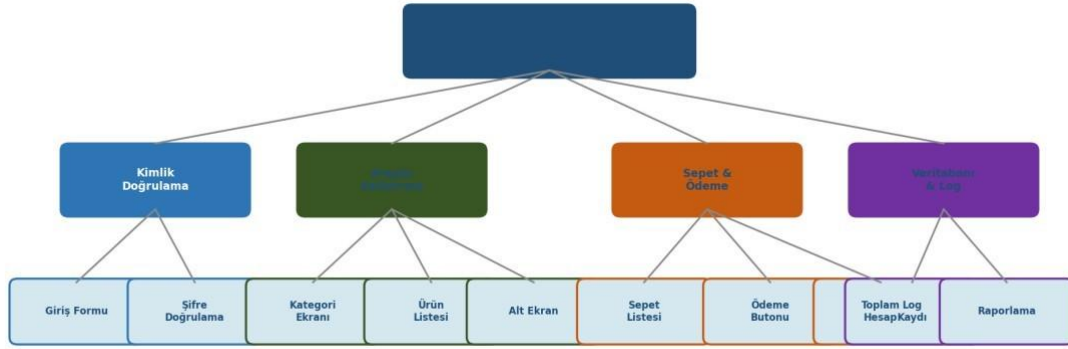

İş Kırılım Yapısı (WBS) - Market POS Sistemi

Şekil 5 – İş Kırılım Yapısı (WBS): Market POS Sistemi

WBS Detayları

17. Kimlik Doğrulama Modülü: Giriş formu tasarımı, şifre doğrulama algoritması, oturum log kaydı (2 ay)
18. Arayüz Geliştirme: Ana ekran kategori yapısı, alt kategori ekranları, mobil uyumluluk (3 ay)
19. Sepet ve Ödeme: Sepet listesi bileşeni, toplam hesaplama, ödeme butonu entegrasyonu (3 ay)
20. Veritabanı ve Log Sistemi: Şema tasarımı, CRUD işlemleri, log kayıt mekanizması (2 ay)
21. Test ve Entegrasyon: Birim testler, entegrasyon testleri, UAT (1 ay)

8.1 Ağ Diyagramı ve Bağımlılık Analizi

Bu bölümde, önceki rapordaki kapsam, WBS ve görev planı çıktıları; ağ diyagramı mantığıyla özetlenmiş ve yalnızca gerekli ekler rapora dahil edilmiştir. Eklenen içerik; faaliyet süreleri, temel bağımlılıklar, seçilmiş AOA şeması ve kritik yol özetinden oluşmaktadır.

Bu bölüme seçilerek eklenen içerikler

- Faaliyet listesi ve öncelik bağımlılıkları
- AOA ağ diyagramının temizlenmiş görseli
- Kritik yol ve toplam süre özeti

8.1 Faaliyet Listesi ve Hemen Önceki İlişkiler


Kod	Faaliyet	Süre (Gün)	Hemen Önceki	Düğüm
A	Proje Hazırlık & Başlangıç Toplantısı	9	—	(1,2)
B	Gereksinim Analizi & Dokümantasyon	8	A	(2,3)
C	UI/UX Tasarım & Prototipleme	12	B	(3,4)
D	Veritabanı Tasarımı & Kurulum	8	B	(3,5)
E	Kimlik Doğrulama API Geliştirme	8	D	(5,6)
F	Ürün & Kategori API Geliştirme	9	D	(5,7)
G	Ödeme & Log Servisi Geliştirme	8	D	(5,8)
H	Frontend Ana Ekran & Navigasyon	9	C, E	(6,9)
I	Sepet Bileşeni Geliştirme	8	F, H	(9,10)
J	Ödeme Ekranı & Fiş Geliştirme	7	G, H	(9,11)
K	Backend-Frontend Entegrasyonu	10	I, J	(11,12)

L	Birim Testleri	9	K	(12,13)
M	Entegrasyon Testleri	7	L	(13,14)
N	Kullanıcı Kabul Testi (UAT)	6	M	(14,15)
O	Hata Düzeltme & Regresyon	9	N	(15,16)
P	Devreye Alma & Kasiyer Eğitimi	7	O	(16,17)
Q	Proje Kapanışı & Belgeleme	5	P	(17,18)

Not: H, I, J ve K faaliyetleri bileşke yapıdadır; bu nedenle çizimde sanal faaliyetler kullanılarak öncelik ilişkileri netleştirilmiştir.

8.2 POS Projesi AOA Ağ Diyagramı

Aşağıda, gönderilen diyagram alternatifleri içinden en okunaklı ve tekrar etmeyen sürüm seçilmiştir. Kesik kırmızı oklar, yalnızca öncelik ilişkisini göstermek için kullanılan sanal faaliyetleri (dummy) ifade eder.

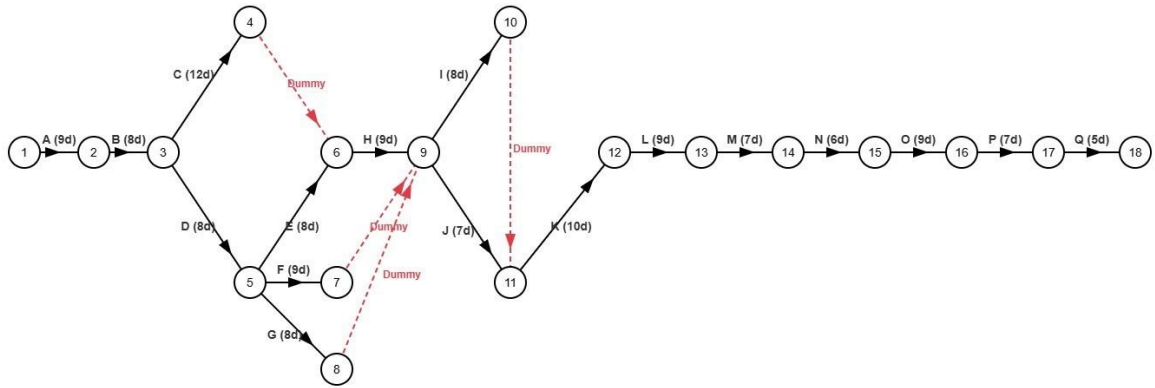

Şekil 1. POS projesi için seçilen AOA ağ diyagramı. D1, D2 ve D3 dummy bağlantıları; H, I ve J bileşke faaliyetlerinin öncelik kurgusunu ayırmak için kullanılmıştır.

Sanal Faaliyetler (Dummy) — Kısa Açıklama

Sanal Faaliyet	Bağlantı	Gerekçe
D ₁	4 → 6	H faaliyeti hem C hem de E tamamlandıktan sonra başlayabilsin diye eklenmiştir.
D ₂	7 → 9	I faaliyeti için F bağımlılığı, H yolundan ayrı biçimde gösterilmiştir.
D ₃	8 → 9	J faaliyeti için G bağımlılığı, H yolundan bağımsız olarak korunmuştur.

8.3 Kritik Yol Özeti

Kritik Yol Yöntemi (CPM), faaliyet süreleri ve bağımlılıklar üzerinden uygulanmıştır. H faaliyeti C ve E'yi; I faaliyeti F ve H'yi; K faaliyeti ise I ve J'yi beklediği için gecikme riski özellikle bu birleşim düğümlerinde yoğunlaşmaktadır.

Toplam Planlanan Süre

103 iş günü

Faaliyet sürelerinin kritik yol toplamı

Kritik Yol

A-B-D-E-H-I-K-L-M-N-O-P-Q

Bu yol üzerindeki gecikme, proje bitişini doğrudan uzatır

Kritik Yol Üzerindeki Faaliyetler

Kod	Süre	ES	EF	Açıklama
A	9	0	9	Başlangıç hazırlığı
B	8	9	17	Analiz ve dokümantasyon
D	8	17	25	Veritabanı altyapısı
E	8	25	33	Kimlik doğrulama API
H	9	33	42	Ana ekran ve navigasyon
I	8	42	50	Sepet bileşeni
K	10	50	60	Backend-frontend entegrasyonu
L	9	60	69	Birim testleri


M	7	69	76	Entegrasyon testleri
N	6	76	82	UAT
O	9	82	91	Hata düzeltme
P	7	91	98	Devreye alma ve eğitim
Q	5	98	103	Kapanış ve belgeleme

Kritik olmayan faaliyetlerin toplam esnekliği: C = 4 gün, F = 8 gün, G = 10 gün, J = 1 gün. Sonuç olarak, proje takibi yapılırken özellikle E, H, I ve K birleşim noktaları yakından izlenmelidir. Bu alanlarda oluşacak gecikmeler doğrudan toplam proje süresine yansımaktadır; buna karşılık C, F, G ve J faaliyetleri sınırlı da olsa zaman esnekliğine sahiptir.

9. Proje Yaşam Döngüsü ve Aşamaları

Proje yaşam döngüsü; birbirini izleyen ancak iç içe geçmiş bağımsız aşamalardan oluşan sürekli bir süreçtir. Market POS projemiz PMI standartlarına göre aşağıdaki yedi aşamada yönetilecektir.

Proje Yaşam Döngüsü - Market POS Sistemi



Şekil 6 – Proje Yaşam Döngüsü: Market POS Sistemi

Aşama 1 – Proje Başlatma Belgesi (Kabulü) Geliştirilmesi

Projeye resmi yetkilendirme sağlayan bu belge; paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini, iş gereksinimlerini, atanmış proje yöneticisini ve özet bütçe bilgisini içermektedir. Market POS projesinde başlatma gerekçeleri şunlardır:

-
- Pazar talebi: Küçük/orta ölçekli marketlerin dijital dönüşüm ihtiyacı
 - Ticari ihtiyaç: Manuel kasa süreçlerindeki hata ve kayıpların azaltılması
 - Teknolojik ilerleme: Bulut tabanlı POS çözümlerine geçiş trendi

Aşama 2 – Proje Ön Kapsam Tanımının Geliştirilmesi

Bu aşamada projenin sınırları, ürün özellikleri, kabul kriterleri ve başlangıç riskleri belgelenmektedir. Market POS için kapsam tanımı şu unsurları içerir:

- Ürün hedefleri: Hızlı, hatasız ve izlenebilir kasa işlemleri
- Kabul kriterleri: 3 saniyelik işlem süresi hedefi, %99.5 sistem uptime
- Kapsam dışı: Muhasebe entegrasyonu, e-ticaret modülü (ilk versiyon için)
- Başlangıç riskleri: Donanım uyumsuzluğu, veri güvenliği açıkları

Aşama 3 – Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi

Projenin nasıl yürütüleceğini, izleneceğini, denetleneceğini ve kapatılacağını tanımlayan kapsamlı plandır. Bu plan; seçilen proje yönetim süreçleri, araç ve tekniklerin tanımları, değişikliklerin nasıl izleneceği ve paydaşlar arası iletişim yöntemlerini kapsamaktadır.

Aşama 4 – Yürütmenin Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi

Bu aşamada onaylı düzeltici eylemler, önleyici eylemler ve değişiklik istekleri hayata geçirilir. 5 kişilik ekibimiz için haftalık sprint toplantıları ve iki haftada bir paydaş bilgilendirme raporları bu aşamanın temel araçlarıdır.

Aşama 5 – Proje İşlerinin İzlenmesi ve Kontrolü

Gerçek proje başarımının proje yönetim planı ile karşılaştırıldığı bu aşamada; düzeltici/önleyici eylem gereklilikleri değerlendirilir, proje riskleri izlenir ve maliyet/takvim tahminleri güncellenir. Market POS projesinde bu amaçla haftalık ilerleme raporları ve sprint burndown chartları kullanılacaktır.

Aşama 6 – Entegrasyon Değişiklik Kontrolü

Projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar tüm değişiklik taleplerinin sistematik olarak değerlendirilip onaylandığı bu süreç, kapsam kaymasını önlemek açısından kritik öneme sahiptir. Market POS projesinde tüm değişiklik talepleri yazılı olarak belgelenecek ve proje yöneticisinin onayına sunulacaktır.

Aşama 7 – Projenin Kapatılması

Proje kapanışında; teslimat kalemlerinin doğrulanması, müşteri kabulünün alınması, idari kapanış ve sözleşme kapanış prosedürleri tamamlanacaktır. "Lessons Learned" belgesi hazırlanarak gelecekteki projeler için kurumsal bilgi birikimi oluşturulacaktır.

10. Sonuç ve Değerlendirme

Bu raporda, Market Satış ve Kasa Yönetim Sistemi (POS) projesinin tüm analiz ve planlama aşamaları detaylı biçimde ele alınmıştır. Gerçekleştirilen analizlerin özeti aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Analiz/Planlama Aracı	Temel Bulgu / Çıktı
Proje Üçgeni	Kapsam (5 modül), Zaman (10 ay), Maliyet (5 kişi) dengesi belirlenmiştir
Proje Türü	C Türü: Orta karmaşıklık, yüksek teknoloji, orta risk
SWOT Analizi	Güçlü yönler öne çıkarılmış, risk azaltma stratejileri belirlenmiştir
Delphi Tekniği	Uzman görüşleriyle gereksinim öncelikleri belirlenmiştir
Beyin Fırtınası	6 yenilikçi özellik fikri üretilmiş, 3 tanesi kapsama alınmıştır
Balık Kılıcı	Satış hatası kök nedenleri: Personel ve Sistem Hatası olarak tespit edilmiştir
Gantt Şeması	10 aylık takvim, kritik yol belirlenmiştir
WBS	5 ana modül, 15+ iş paketi tanımlanmıştır
Proje Yaşam Döngüsü	7 aşamalı PMI standardı uygulanacaktır
